

OFÍCIO Nº 48/2024.

Augusto Corrêa, 06 de fevereiro 2024.


RAFAEL RODRIGO ARAÚJO DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças

Assunto: Encaminhamento de Solicitação de Aditivo de prazo

Venho pelo presente cumprimentar vossa senhoria e encaminhar processo que trata sobre **o aditamento de prazo do contrato** nº 20229846 da TP Nº 013/2022 que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA - CESAC** entre esta Secretaria e a empresa **N ESTHEFANY F DA SILVA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, por mais 60 (sessenta) dias, conforme Nota Técnica elaborada pelo responsável pela fiscalização da obra.

Tendo em vista a necessidade de darmos continuidade aos serviços para a finalização da obra que é de suma importância para as atividades essenciais desta secretaria, e com o intuito de dar celeridade ao processo, encaminho junto a este o ofício de solicitação de aditivo da empresa, extrato de contrato, certidões fiscais e trabalhistas e Nota Técnica em anexo, para dar celeridade ao processo.


Certa de que posso contar com a sua colaboração, agradeço antecipadamente, ao tempo que reitero protesto de elevada estima e consideração.


GELZICLENE NOGUEIRA DA PENHA ARAÚJO
Secretária Municipal de Saúde

Decreto 005/2022
Sec. Mun. de Saúde
Decreto Nº 005/2022

ESTADO DO PARA
Prefeitura Mun. de Augusto Corrêa
Secretaria de Admin. Finanças
SERVICO DE PROTOCOLO
RECEBI
EM. 06/02/24
HORARIO. 15:09

Responsável


Encarregado P/ Gestor de Contratos
Rafael Rodrigo Araújo da Silva
Sec. Mun. de Admin. e Finanças
Decreto Nº 011/2021-688/PREFEITO

OFÍCIO Nº 46/2024.

Augusto Corrêa (PA), 05 de fevereiro 2024.

CONTRATO Nº 20229846

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA – CESAC.

ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Ao

Senhor Secretário,

Orlandino Adriano de Seixas Alves

Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo


Senhor Secretário,

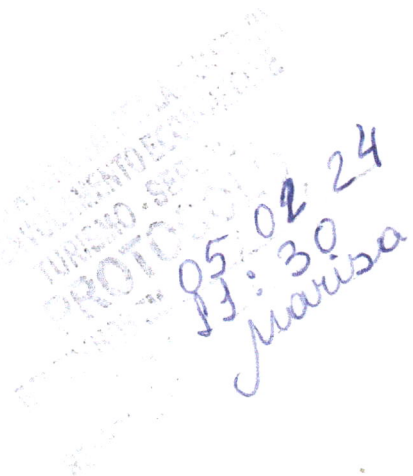
Considerando o pedido de prorrogação de prazo contratual apresentado pela empresa N ESTHEFANY F DA SILVA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que justifica seu pedido em **decorrência contratemplos climáticos da região, gerando atraso nos serviços**, venho através deste solicitar análise quanto ao tempo de finalização da obra pela justificativa apresentada, bem como pedimos relatório de execução do Contrato nº 20229846.

Segue a análise para as devidas providências.

Atenciosamente,


GELZICLENE NOGUEIRA DA PENHA ARAÚJO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 05/2022


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DECRETO Nº 05/2022


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROTO Nº 05/2024
05.02.24
Marisa



N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.178.552/0001-40
Silvaengenharia2017@gmail.com

SOLICITAÇÃO

Ofício 05/2024

Assunto: Referente ao 4º termo Aditivo de Prazo

Contrato nº: 20229846

Tomada de preços nº: 013/2022

Contratada: N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ: 27.178.552/0001-40

Endereço: TRAVESSA MONTE ALEGRE, 122, LOJA 04 (ANEXO ACESSO RUA DE ÓBDOS), CIDADE VELHA, CEP: 66020-700, BELÉM/PA.

Objeto: SERVIÇO DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA-CESAC

A Secretaria de Saúde,

O Contrato nº 20229846 tem como objeto a **SERVIÇO DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA-CESAC.**

Estado do Para
Prefeitura Municipal de Augusto Correa
Secretaria Municipal de Saude
CNPJ: 12.381.567/0001-34
Serviço de Protocolo

RECEBI

Em 05 / 02 / 2024
Horário 09 : 00
Responsável Prudência

Endereço: Tv Monte Alegre, 122, loja 04 (anexo acesso Rua de Óbidos),
Cidade Velha, CEP: 66020-700, Belém-Pará.
Tel: (91) 99205-8534 / (91) 98947-7721



N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.178.552/0001-40
Silvaengenharia2017@gmail.com

DA FORMALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

O Contrato nº 20229846 tem vigência de 08 (oito) meses iniciado no dia 26/07/2022. O prazo de execução é de 180 (cento e oitenta) dias a partir da ordem de serviço emitida no dia 26/07/2022. Com base no Artigo 57 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, § 1º, IV.

IV - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação motivada pelo fato de contratemplos climáticos da região gerando atraso nos serviços. Por esse motivo, venho respeitosamente, solicitar o aditamento de prazo do contrato em questão por mais 100 (cem) dias.

É nossa justificativa.

Augusto Corrêa, 05 de fevereiro de 2024.

N ESTHEFANY F DA
SILVA COMERCIO
CONSTRUCOES E
SER:27178552000140
2024.02.05 08:01:19
-03'00'

Responsável legal pela empresa

Endereço: Tv Monte Alegre, 122, loja 04 (anexo acesso Rua de Óbidos),
Cidade Velha, CEP: 66020-700, Belém-Pará.
Tel: (91) 99205-8534 / (91) 98947-7721

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.178.552/0001-40
Razão Social: N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO CONST
Endereço: RUA DOS PARIQUIS 930 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/02/2024 a 01/03/2024

Certificação Número: 2024020200244040523639

Informação obtida em 01/02/2024 13:18:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 27.178.552/0001-40

Razão social: N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO CONST

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031001520277676208
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022005435641769895
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020200244040523639
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011301424798599140
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122501402861607763
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120619170933841599
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707220872922682
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102901482944162199
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101019463696450706
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092107361988061692
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090201513550203059
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081419372038430679
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072606310623585637
07/07/2023	07/07/2023 a 05/08/2023	2023070719465212570604
18/06/2023	18/06/2023 a 17/07/2023	2023061801435794909353
30/05/2023	30/05/2023 a 28/06/2023	2023053002133458111265
11/05/2023	11/05/2023 a 09/06/2023	2023051101561978786724
22/04/2023	22/04/2023 a 21/05/2023	2023042201393323816329
03/04/2023	03/04/2023 a 02/05/2023	2023040301431278787129
15/03/2023	15/03/2023 a 13/04/2023	2023031501562557912633
24/02/2023	24/02/2023 a 25/03/2023	2023022402002597327062
05/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	2023020501292102913302
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011701513901807098
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	2022122901595222130342
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	2022121001493965446168
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	2022112101443191723487
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	2022110202021877668563
14/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	2022101402251156795574
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	2022092501421073633976
06/09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	2022090602073847368867
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	2022081801534663818502
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	2022073001485969803564



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 27.178.552/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:12:13 do dia 16/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/05/2024.

Código de controle da certidão: **A6D2.418D.3A6B.7795**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 27.178.552/0001-40

Código de Controle: A6D2.418D.3A6B.7795

Data da Emissão: 16/11/2023

Hora da Emissão: 16:12:13

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 16/11/2023, com validade até 14/05/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.178.552/0001-40
Certidão nº: 69535511/2023
Expedição: 05/12/2023, às 22:02:25
Validade: 02/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.178.552/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.554.229-0

CNPJ: 27.178.552/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 07:37:27 do dia 30/11/2023

Válida até: 28/05/2024

Número da Certidão: 702023081234076-3

Código de Controle de Autenticidade: E1132CE1.03BACDA4.25E5DC6E.BA6CF45E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Resultado

Consulta autenticidade de certidões

Nome Empresarial: N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.554.229-0

CNPJ: 27.178.552/0001-40

Emitida às: 07:37:27 no dia 30/11/2023

Válida até: 28/05/2024

Tipo Certidão: Negativa Tributária

Nº Certidão: 702023081234076-3

Código de controle de autenticidade: E1132CE1.03BACDA4.25E5DC6E.BA6CF45E

[Nova consulta](#)

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.554.229-0

CNPJ: 27.178.552/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 07:37:27 do dia 30/11/2023

Válida até: 28/05/2024

Número da Certidão: 702023081234077-1

Código de Controle de Autenticidade: 2260F27B.7CE6FF1F.2D0775AC.2837C622

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida iminente.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 112764/119/2023

Contribuinte: **N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO, CONSTRUCOE**
CPF/CNPJ: **27.178.552/0001-40**
Inscrição Mobiliária: **281378-6**
Inscrição **016/35881/14/52/0202/000/000-54 (ALUGADO)**
Endereço **TV MONTE ALEGRE , 122 LOJA:04; ANEXO:ACESSO RUA DE O**

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **13:49** horas, do dia **18/10/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : **EUUY.K85D.RWIG.AC6Z.XRUB**

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Certidão Autêntica

Tipo Certidão:	CONJUNTA NEGATIVA OU POSITIVA C/EFEITO DE NEGATIVA
Número do protocolo:	112764/119/2023
Contribuinte	N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO, CONSTRUCOE
Inscrição Mobiliária:	281378-6
Inscrição Imobiliária:	
Inscrição(ões) D Ativa de Créditos não Tributáveis:	
Data Emissão:	18/10/2023
Hora Emissão:	13:49
Validade:	Validade 180 cento e oitenta dia(s)
Código de verificação:	EUUY.K85D.RWIG.AC6Z.XRUB

Ofício GS/SEPLADE Nº 032-B/2024

Augusto Corrêa/PA, 06 de fevereiro de 2024

À

Sra. Geuziclene Nogueira Penha Araújo

M.D. Secretária Municipal de Saúde - SEMSA

Nesta

Senhora Secretária,

Ao cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminhar a vossa senhoria, conforme solicitado através do ofício nº 46/2024 - SEMSA, a nota técnica nº 001/2024, em anexo, elaborada pelo fiscal da obra, referente à solicitação de aditamento de prazo do contrato, cujo o objeto: Reforma ao centro de especialidades médicas de Augusto Corrêa/PA – CESAC, oriundo do **processo licitatório nº 013/2022**, e **contrato nº 20229846**, celebrado entre a Fundo Municipal de Saúde e a empresa N ESTHEFANY DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

Cordialmente,

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 12.381.567/0001-34
Serviço de Protocolo

RECEBI

Em 06 / 02 / 2024

Horário 14:09

Responsável


Orlandino Adriano de Seixas Alves

Secretário Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento Econômico e Turismo

Orlandino Adriano de Seixas Alves
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO,
DESENV. ECONÔMICO E TURISMO
OFÍCIO Nº 032/2024



PREFEITURA DE
**AUGUSTO
CORRÊA**
Governo do Trabalho

NOTA TÉCNICA Nº 001/2024

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA - CESAC

Laianny Cristiny R. Oliveira
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PA
Nº 1517817538 - SEPLADE
CONTRATO Nº 20230158

NOTA TÉCNICA Nº 001/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA – CESAC

CONTRATO: Nº 20229846

TOMADA DE PREÇO: TP Nº013/2022

DATA: 06 DE FEVEREIRO DE 2024



SEPLADE
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo


NOTA TÉCNICA N° 001/2024

A Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEPLADE, neste ato representada pela Sr^a. Laianny Cristinny Ribeiro de Oliveira Engenheira Civil Fiscal da Obra, conforme ART N° PA20230957326, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará-CREA número do conselho n° 1517817536, vem informar, que relativo ao **Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA – CESAC**, a empresa N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA executou 86,02% de obra, correspondente ao valor de R\$ 477.811,67 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL, OTOCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme anexo 01.

Portanto, solicitamos prorrogação de 60 (sessenta) dias corridos para o aditivo de prazo do Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA – CESAC.**

Laianny Cristinny R. Oliveira
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PA
N° 1517817536 - SEPLADE
CONTRATO N° 20230156

TÉCNICO(A):


Téc. Resp. Laianny Cristinny Ribeiro de Oliveira
Engenheira Civil
CREA/PA 1517817536



ANEXOS

Laianny Cristinny R. Oliveira
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PA
Nº 15178/1536 - SEPLADE
CONTRATO Nº 20230156

ANEXO 01

Laianny Cristhmy R. Oliviera
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PA
Nº 1517817536 - SEPLADE
CONTRATO Nº 20230156

BM - 04

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA - CESAC

CONTRATO: Nº 20229846

Nº DA LICITAÇÃO: TP Nº 013/2023 TP

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA - CESAC



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº94

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 24/07/2023 a 20/12/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 21/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO								ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL		SALDO A EXECUTAR		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI (R\$)	Total Contrato(R\$)	QUANT.	VALOR PAGO (R\$)	%	QUANT.	VALOR A PAGAR (R\$)	%	%	R\$	%	R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.520,43		R\$ 6.520,43	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 6.520,43	100,00%	R\$ 0,00
1.1	11340	SEDOF	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	6,00	R\$ 175,52	R\$ 226,06	R\$ 1.356,36	6,00	R\$ 1.356,36	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.356,36	0,00%	R\$ 0,00
1.2	11170	SEDOF	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA E SEMMA)	unid.	1,00	R\$ 2.866,38	R\$ 3.691,89	R\$ 3.691,89	1,00	R\$ 3.691,89	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 3.691,89	0,00%	R\$ 0,00
1.3	COMP.002	PROPRIO	MOBILIZAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 1.143,00	R\$ 1.472,18	R\$ 1.472,18	1,00	R\$ 1.472,18	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.472,18	0,00%	R\$ 0,00
2			DEMOLIÇÕES E RETRADAS					R\$ 23.371,99		R\$ 22.981,58	98,33%		R\$ 1.212,38	5,19%	5,19%	R\$ 24.193,97	94,81%	-R\$ 821,98
2.1	20016	SEDOF	DEMOLIÇÃO MANJAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	m³	81,45	R\$ 54,93	R\$ 70,74	R\$ 5.761,77	81,45	R\$ 5.761,77	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 5.761,77	0,00%	R\$ 0,00
2.2	20174	SEDOF	RETRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	m³	15,88	R\$ 91,29	R\$ 117,58	R\$ 1.867,17	15,88	R\$ 1.867,17	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.867,17	0,00%	R\$ 0,00
2.3	20235	SEDOF	RETRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	m²	308,84	R\$ 7,31	R\$ 9,41	R\$ 2.906,18	180,00	R\$ 1.693,80	58,28%	128,84	R\$ 1.212,38	41,72%	100,00%	R\$ 2.906,18	0,00%	R\$ 0,00
2.4	20021	SEDOF	RETRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	269,06	R\$ 5,48	R\$ 7,05	R\$ 1.896,86	385,65	R\$ 2.718,83	143,33%		R\$ 0,00	0,00%	143,33%	R\$ 2.718,83	-43,33%	-R\$ 821,98
2.5	20019	SEDOF	RETRADA DE REBOCO OU EMBOÇO	m²	285,00	R\$ 5,48	R\$ 7,05	R\$ 2.009,25	285,00	R\$ 2.009,25	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 2.009,25	0,00%	R\$ 0,00
2.6	20014	SEDOF	RETRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO	m²	24,10	R\$ 5,25	R\$ 6,76	R\$ 162,91	24,10	R\$ 162,91	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 162,91	0,00%	R\$ 0,00
2.7	21534	SEDOF	RETRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	m²	510,86	R\$ 5,44	R\$ 7,00	R\$ 3.576,02	510,86	R\$ 3.576,02	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 3.576,02	0,00%	R\$ 0,00
2.8	20020	SEDOF	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DE COBERTURA (50%)	m²	287,00	R\$ 6,44	R\$ 8,29	R\$ 2.379,23	287,00	R\$ 2.379,23	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 2.379,23	0,00%	R\$ 0,00
2.9	20024	SEDOF	RETRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	m²	574,00	R\$ 3,81	R\$ 4,90	R\$ 2.812,60	574,00	R\$ 2.812,60	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 2.812,60	0,00%	R\$ 0,00
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 323,22		R\$ 323,22	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 323,22	100,00%	R\$ 0,00
3.1	30010	SEDOF	ESCAVAÇÃO MANJAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE	m³	3,00	R\$ 48,87	R\$ 62,94	R\$ 188,82	3,00	R\$ 188,82	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 188,82	0,00%	R\$ 0,00
3.2	30254	SEDOF	REATERRO COMPACTADO	m³	2,00	R\$ 52,18	R\$ 67,20	R\$ 134,40	2,00	R\$ 134,40	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 134,40	0,00%	R\$ 0,00
4			COBERTURA					R\$ 60.913,80		R\$ 59.414,74	97,54%		R\$ 1.499,06	2,46%	2,46%	R\$ 60.913,80	97,54%	R\$ 0,00
4.1	70054	SEDOF	ESTRUTURA EM MAD. P/FIBROCIMENTO - PC, SERRADA	m²	287,00	R\$ 58,00	R\$ 74,70	R\$ 21.438,90	287,00	R\$ 21.438,90	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 21.438,90	0,00%	R\$ 0,00
4.2	71498	SEDOF	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E= 4MM	m²	574,00	R\$ 51,37	R\$ 66,16	R\$ 37.975,84	574,00	R\$ 37.975,84	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 37.975,84	0,00%	R\$ 0,00
4.3	140479	SEDOF	Regrado em madeira lei p/brisa e/ barroteamento	m²	14,36	R\$ 77,00	R\$ 100,20	R\$ 1.499,06		R\$ -	0,00%	14,36	R\$ 1.499,06	100,00%	100,00%	R\$ 1.499,06	0,00%	R\$ 0,00
5			COBERTURA					R\$ 63.710,37		R\$ 62.173,39	75,61%		R\$ 15.536,98	24,39%	24,39%	R\$ 63.710,37	75,61%	R\$ 0,00
5.1	91317	SEDOF	ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM - barteiros	m²	1,08	R\$ 542,70	R\$ 698,99	R\$ 754,91	0,96	R\$ 671,03	88,89%	0,12	R\$ 83,88	11,11%	100,00%	R\$ 754,91	0,00%	R\$ 0,00
5.2	91511	SEDOF	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM - somente fachada principal	m²	14,00	R\$ 564,08	R\$ 726,53	R\$ 10.171,42	9,00	R\$ 6.538,77	64,29%	5,00	R\$ 3.632,65	35,71%	100,00%	R\$ 10.171,42	0,00%	R\$ 0,00
5.3	90482	SEDOF	PORTA MAD. COMPENS. REVEST. FORMICA C/CAIX. SIMPLES	m²	42,63	R\$ 369,68	R\$ 476,14	R\$ 20.297,84	40,32	R\$ 19.197,96	94,58%	2,31	R\$ 1.099,88	5,42%	100,00%	R\$ 20.297,84	0,00%	R\$ 0,00
5.4	91379	SEDOF	PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/FERRAGENS - (SEM MOLA) - acesso principal	m²	40,73	R\$ 563,73	R\$ 726,00	R\$ 29.569,60	25,96	R\$ 18.949,03	63,74%	14,77	R\$ 10.720,57	36,26%	100,00%	R\$ 29.569,60	0,00%	R\$ 0,00
5.5	90242	SEDOF	PORTA MAD. DE LEI MILO LENCIL DE CHUMBO - sala rate - X	m²	2,10	R\$ 1.078,31	R\$ 1.388,86	R\$ 2.916,60	2,10	R\$ 2.916,60	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 2.916,60	0,00%	R\$ 0,00
6			REVESTIMENTO E FORRO					R\$ 85.436,88		R\$ 88.433,47	68,86%		R\$ 26.602,62	31,14%	31,14%	R\$ 85.436,88	68,86%	R\$ 0,00
6.1	110763	SEDOF	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6: ADIT. PLAST.	m²	441,70	R\$ 42,69	R\$ 54,98	R\$ 24.284,93	385,65	R\$ 21.203,03	87,31%	56,05	R\$ 3.081,90	12,69%	100,00%	R\$ 24.284,93	0,00%	R\$ 0,00
6.2	110245	SEDOF	REBOCO COM ARGAMASSA BARIADA	m²	45,00	R\$ 168,76	R\$ 217,36	R\$ 9.781,20	45,00	R\$ 9.781,20	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 9.781,20	0,00%	R\$ 0,00
6.3	110644	SEDOF	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO	m²	63,24	R\$ 92,20	R\$ 106,87	R\$ 6.695,21	54,01	R\$ 5.718,04	85,40%	9,23	R\$ 977,18	14,60%	100,00%	R\$ 6.695,21	0,00%	R\$ 0,00
6.4	110645	SEDOF	FORRO EM LAMBRI DE PVC - mesma área de piso	m²	383,54	R\$ 90,44	R\$ 116,48	R\$ 44.674,74	190,00	R\$ 22.331,20	49,54%	193,54	R\$ 22.343,54	50,46%	100,00%	R\$ 44.674,74	0,00%	R\$ 0,00
7			PISOS					R\$ 49.008,37		R\$ 27.064,48	55,22%		R\$ 21.943,89	44,78%	44,78%	R\$ 49.008,37	55,22%	R\$ 0,00
7.1	130725	SEDOF	LAJOTA CERÂMICA - (PADRÃO ALTO)	m²	369,05	R\$ 100,79	R\$ 129,81	R\$ 47.905,89	200,00	R\$ 25.962,00	54,19%	169,05	R\$ 21.943,89	45,81%	100,00%	R\$ 47.905,89	0,00%	R\$ 0,00
7.2	130492	SEDOF	CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	m²	8,00	R\$ 107,00	R\$ 137,81	R\$ 1.102,48	8,00	R\$ 1.102,48	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.102,48	0,00%	R\$ 0,00
8			PINTURA					R\$ 71.497,35		R\$ 35.110,72	49,11%		R\$ 29.377,82	41,09%	41,09%	R\$ 64.488,54	58,91%	R\$ 7.008,81
8.1	150253	SEDOF	AGRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMASOS	m²	1335,86	R\$ 40,80	R\$ 52,55	R\$ 70.199,21	668,14	R\$ 35.110,72	50,02%	534,34	R\$ 28.079,68	40,06%	90,02%	R\$ 63.190,40	9,98%	R\$ 7.098,81
8.3	150207	SEDOF	Acrylica para piso	m²	55,93	R\$ 18,03	R\$ 23,21	R\$ 1.298,14		R\$ -	0,00%	55,93	R\$ 1.298,14	100,00%	100,00%	R\$ 1.298,14	0,00%	R\$ 0,00
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 54.911,14		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 46.925,34	85,46%	85,46%	R\$ 46.925,34	14,54%	R\$ 7.985,80
9.1	170386	SEDOF	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 32 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO)	unid.	2,00	R\$ 758,76	R\$ 977,28	R\$ 1.954,56		R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 1.954,56	100,00%	100,00%	R\$ 1.954,56	0,00%	R\$ 0,00

LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA:02346744239

Assinado de forma digital por LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA:02346744239

N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO CONSTRUCOES E SER:27178552000140

N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO CONSTRUCOES E SER:27178552000140

BM - 04

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AGUSTO CORRÊA/PA - CESAC

CONTRATO: Nº 20220846

Nº DA LICITAÇÃO: TP Nº 013/2023 TP

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AGUSTO CORRÊA/PA - CESAC



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº94

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 24/07/2023 a 20/12/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 21/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO							ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL		SALDO A EXECUTAR			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI (R\$)	Total Contrato(R\$)	QUANT.	VALOR PAGO (R\$)	%	QUANT.	VALOR A PAGAR (R\$)	%	%	R\$	%	R\$
9.2	170330	SEDOP	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN	und	14,00	R\$ 37,63	R\$ 46,55	R\$ 523,70										
9.3	230262	SEDOP	Ponto p/w condicionado(tubul. c/ alstrop e fiação)	und	16,00	R\$ 481,97	R\$ 620,77	R\$ 9.932,32										
9.4	170317	SEDOP	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	m	361,43	R\$ 9,23	R\$ 11,59	R\$ 4.178,50										
9.5	170318	SEDOP	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	m	570,59	R\$ 11,68	R\$ 15,04	R\$ 8.583,18										
9.6	170362	SEDOP	DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN	und	50,00	R\$ 63,76	R\$ 82,12	R\$ 4.106,00										
9.7	170081	SEDOP	PONTO DE LUZ /FORÇA C/ TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	pl	44,00	R\$ 222,85	R\$ 267,03	R\$ 12.629,32										
9.8	170999	SEDOP	LÂMPADA FLUORESCENTE COM REATOR ACOPLADO (PLL) 20W - 127V/220V 127V/220V	und	40,00	R\$ 17,23	R\$ 22,19	R\$ 887,60										
9.9	171016	SEDOP	Luminária abajur - sobrepôr (2x40W) - completa	und	20,00	R\$ 154,43	R\$ 190,48	R\$ 3.979,60										
9.10	171491	SEDOP	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	pl	42,00	R\$ 89,63	R\$ 115,44	R\$ 4.848,48										
9.11	170339	SEDOP	Tomada 2P+T 10A (5Ação)	und	52,00	R\$ 24,73	R\$ 31,04	R\$ 1.655,68										
9.12	170978	SEDOP	Luminária c/ lâmp de emergência	und	22,00	R\$ 52,10	R\$ 67,10	R\$ 1.476,20										
10			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS					R\$ 40.478,47		R\$ 17.044,64	42,11%		R\$ 21.611,62	53,89%	53,89%	R\$ 38.656,26	46,61%	R\$ 1.822,21
10.1	180299	SEDOP	PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES)	pl	16,00	R\$ 453,49	R\$ 584,09	R\$ 9.345,44	16,00	R\$ 9.345,44	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 9.345,44	0,00%	R\$ 0,00
10.2	180214	SEDOP	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CX. E RALOS)	pl	16,00	R\$ 373,61	R\$ 481,20	R\$ 7.699,20	16,00	R\$ 7.699,20	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	R\$ 7.699,20	0,00%	R\$ 0,00
10.3	190609	SEDOP	BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO	pl	6,00	R\$ 572,49	R\$ 737,36	R\$ 4.424,16				6,00	R\$ 4.424,16	100,00%	100,00%	R\$ 4.424,16	0,00%	R\$ 0,00
10.4	190716	SEDOP	BARRA EMAÇO INOX (PCD)	m	3,00	R\$ 281,38	R\$ 362,41	R\$ 1.087,23				3,00	R\$ 1.087,23	100,00%	100,00%	R\$ 1.087,23	0,00%	R\$ 0,00
10.5	190218	SEDOP	CHUVEIRO EM PVC	und	1,00	R\$ 28,46	R\$ 36,65	R\$ 36,65					R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 36,65
10.6	190375	SEDOP	LAVATÓRIO DE LOUÇA C/ COL., TORNEIRA, SIFÃO E VALV.	und	7,00	R\$ 591,34	R\$ 761,64	R\$ 5.331,48				7,00	R\$ 5.331,48	100,00%	100,00%	R\$ 5.331,48	0,00%	R\$ 0,00
10.7	190303	SEDOP	BACIA SIFONADA - PCD	und	1,00	R\$ 1.818,93	R\$ 2.342,78	R\$ 2.342,78				1,00	R\$ 2.342,78	100,00%	100,00%	R\$ 2.342,78	0,00%	R\$ 0,00
10.8	190304	SEDOP	LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN. SIFÃO E VALVULA) - PCD	und	1,00	R\$ 886,19	R\$ 1.141,41	R\$ 1.141,41				1,00	R\$ 1.141,41	100,00%	100,00%	R\$ 1.141,41	0,00%	R\$ 0,00
10.9	180844	SEDOP	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	pl	24,00	R\$ 136,04	R\$ 175,21	R\$ 4.205,04				24,00	R\$ 4.205,04	100,00%	100,00%	R\$ 4.205,04	0,00%	R\$ 0,00
10.10	180845	SEDOP	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	pl	16,00	R\$ 149,44	R\$ 192,47	R\$ 3.079,52				16,00	R\$ 3.079,52	100,00%	100,00%	R\$ 3.079,52	0,00%	R\$ 0,00
10.11	190376	SEDOP	Tanque inox c/ torneira, sifão e válvula	und	1,00	R\$ 627,42	R\$ 808,11	R\$ 808,11					R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 808,11
10.12	89546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO AF. 01/2620	und	5,00	R\$ 181,94	R\$ 199,69	R\$ 978,45					R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 978,45
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 13.885,12		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.982,08	28,68%	28,68%	R\$ 3.982,08	71,32%	R\$ 9.903,04
11.1	231084	SEDOP	PONTO DE DRENO P/SPLIT (10M)	pl	16,00	R\$ 193,23	R\$ 248,88	R\$ 3.982,08				16,00	R\$ 3.982,08	100,00%	100,00%	R\$ 3.982,08	0,00%	R\$ 0,00
11.2	241318	SEDOP	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX LETRAS BX. RELEVO - (40 X 30 CM)	und	1,00	R\$ 790,79	R\$ 1.018,53	R\$ 1.018,53					R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.018,53
11.3	201326	SEDOP	EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 4KG	und	4,00	R\$ 173,29	R\$ 223,19	R\$ 892,76					R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 892,76
11.4	270220	SEDOP	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	m²	574,00	R\$ 6,51	R\$ 8,38	R\$ 4.810,12					R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.810,12
11.5	COMP.003	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	1,00	R\$ 1.327,22	R\$ 1.709,45	R\$ 1.709,45					R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.709,45
11.6	COMP.004	CPU	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 1.143,00	R\$ 1.472,18	R\$ 1.472,18					R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.472,18
12			PAINEL ACM FACHADA					R\$ 51.758,27		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 51.758,27
12.1	061458	SEDOP	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	78,00	R\$ 462,71	R\$ 595,97	R\$ 46.485,66					R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 46.485,66
12.2	84124	SINAPI	LETRA DE AÇO INOX N022 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	37,00	R\$ 110,67	R\$ 142,53	R\$ 5.273,61					R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.273,61
13			MURO FECHAMENTO FACHADA					R\$ 33.653,20		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 33.653,20	100,00%	100,00%	R\$ 33.653,20	0,00%	R\$ 0,00
13.1	021520	SEDOP	Retirada de esquadria metálica	m²	33,84	R\$ 10,40	R\$ 13,50	R\$ 456,84				33,84	R\$ 456,84	100,00%	100,00%	R\$ 456,84	0,00%	R\$ 0,00
13.2	091516	SEDOP	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	33,84	R\$ 761,94	R\$ 989,98	R\$ 33.196,36				33,84	R\$ 33.196,36	100,00%	100,00%	R\$ 33.196,36	0,00%	R\$ 0,00

LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA:02346744239
Assinado de forma digital por LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA:02346744239

N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO CONSTRUÇOES E SER:2717855200014 0
N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO CONSTRUÇOES E SER:2717855200014 0

BM - 04

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA - CESAC

CONTRATO: Nº 20229846

Nº DA LICITAÇÃO: TP Nº 013/2023 TP

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA - CESAC



SEMSA
Secretaria Municipal de Saúde

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 24/07/2023 a 20/12/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 21/12/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CONTRATO DE EXECUÇÃO							ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL		SALDO A EXECUTAR			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI (R\$)	Total Contrato (R\$)	QUANT.	VALOR PAGO (R\$)	%	QUANT.	VALOR A PAGAR (R\$)	%	%	R\$	%	R\$
VALOR TOTAL								R\$ 555.469,81		R\$ 275.466,67	49,59%		R\$ 202.345,80	36,43%	36,43%	R\$ 477.811,67	13,98%	R\$ 77.658,14

O VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO DE Nº04 DOS SERVIÇOS DE Contratação de Pessoa Jurídica para Executar serviços de Reforma ao Centro de Especialidades Médicas de Augusto Corrêa/PA - CESAC. IMPORTA O VALOR GLOBAL DE: R\$ 202.345,00 (Duzentos e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais).

N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO
 N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO
 CONSTRUÇOES E CONSTRUÇOES E
 SER:271785520001 SER:271785520001
 40 40

N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE
 OLIVEIRA:02346744239
 39

Assinado de forma digital por LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA:02346744239

TÉC. RESP. LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PA 1617817636

FISCAL DA OBRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA



TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Na qualidade de Ordenador de Despesas responsável pela Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa e uso de suas atribuições Legais e,

Considerando a necessidade para **OBJETO: Aditivo de prazo ao Contrato de nº 20229846, referente ao Objeto: Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de reforma ao Centro de Especialidades Médicas de Augusto Corrêa/PA.**

Considerando haver adequação orçamentária e financeira das despesas, a Lei Orçamentária em vigor em anexo aos autos,

Resolve **AUTORIZAR** a realização da supracitada despesa e que seja encaminhado o presente Aditivo de Prazo ao setor competente adequado para as providências cabíveis, de forma a verificar a modalidade licitatória mais conveniente para Gestão Pública.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Augusto Corrêa (PA), 07 de Fevereiro de 2024.

Francisco Edinaldo Q. de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Mun. de Augusto Corrêa
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
RECEBI
EM: 07 / 02 / 2024
HORÁRIO: _____

[Assinatura]
R. ...
